



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**SALUD PÚBLICA**

# Informe Ejecución Inversión Tercer Trimestre Julio-Septiembre Año 2020

**Autoridad Ministerio:**

Dr. Antonio Plutarco Arias Arias, Ministro de Salud  
Dr. Edward Guzmán, Viceministro de Planificación y Desarrollo

**Coordinación y revisión:**

Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación Institucional

**Responsable del Informe:**

Licda. Ana M. Pieter Pérez, Enc. de Formulación Monitoreo  
y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos  
Lic. Loira Mateo, Analista de proyectos  
Lic. María Magdalena García, Analista de Programación

Firma Responsable DPI: \_\_\_\_\_



2 de noviembre de 2020

<b>Índice de contenido</b>
Contenido.
Siglas y Acrónimos.
I. Introducción.
II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión trimestre Julio-septiembre año 2020.
III. Marco metodológico de la elaboración del informe.
IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, Julio-septiembre año 2020.
IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública.
IV.1.1 Presupuesto aprobado Vs. ejecutado.
IV.1.2 Ejecución de la inversión según programa presupuestario, Julio-septiembre año 2020.
IV.1.3 Organismos financiadores de la inversión.
IV.1.4 Ejecución financiera por componentes de inversión de los proyectos.
IV.1.4.1 Componentes del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.
IV.1.4.2 Componentes del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.
IV.1.4.3 Componentes del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.
IV.1.5 Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.
IV.2 Ejecución física de la inversión pública por proyecto.
IV.2.1 Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.
IV.2.2 Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.
IV.2.3 Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.
<b>V. Anexos:</b>
Anexo 1: Matriz de ejecución física - financiera de la inversión, período Julio-septiembre año 2020.
Anexo 2: Matriz de proyectos ejecutado Vs. aprobado según programa presupuestario, actividad y fuentes de financiamiento trimestre julio-septiembre año 2020.



## Índice de cuadros y gráficos.

Cuadros:
Cuadro No. 1. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período Julio-septiembre año 2020
Cuadro No. 2. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, período Julio-septiembre año 2020.
Cuadro No. 3. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom., período Julio-septiembre año 2020.
Cuadro No. 4. Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.
Cuadro No. 5. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, Julio-septiembre, año 2020.
Cuadro No. 6. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, Julio-septiembre año 2020.
Cuadro No. 7. Datos de avance en meta del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, Julio-septiembre del año 2020.
Gráficos:
Gráfico No. 1. Presupuesto de inversión ejecutado Vs. vigente, trimestre Julio-septiembre año 2020.
Gráfico No. 2. Ejecución de la inversión por fuentes de financiamiento, trimestre Julio-septiembre año 2020.
Gráfico No. 3. Ejecución de la inversión por fuente de financiamiento
Gráfico No. 4. Organismos financiadores de la inversión



**Siglas y Acrónimos.**

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CONAVIHSIDA	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
DDESS	Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud
DGCP	Dirección General de Crédito Público
DGIP	Dirección General de Inversión Pública
DPI	Dirección de Planificación Institucional
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
GFATM	Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MH	Ministerio de Hacienda
MSP	Ministerio de Salud Pública
MVS	Mujeres de Bateyes en Vulnerabilidad Social
PIP	Plan de Inversión Pública
PNPIP	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SRS	Servicio Regional de Salud
TB	Tuberculosis
TN	Tesoro Nacional
TPI	Terapia Preventiva con Isoniazida (TPI)
VIH/SIDA	Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida



### ***I. Introducción.***

EL Ministerio de Salud Pública elabora el presente informe correspondiente al período Julio-septiembre del año 2020, en el marco de la ejecución de la inversión, en términos de avances físicos y financieros de las acciones y estrategias que se implementan con los proyectos para el logro de las metas planteadas en los planes institucionales, dando así cumplimiento a las normas contenidas en las leyes: N° 423-06 Orgánica de presupuesto, N° 498-06 de Planificación e Inversión Pública, N° 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y la N° 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

Este informe presenta como fueron ejecutados los recursos destinados a los proyectos de inversión, con el fin de tomar las medidas adecuadas y oportunas que permitan reorientar o fortalecer la gestión para una mejor ejecución, además de, satisfacer la demanda de los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados en la institución durante el periodo señalado, así como contribuir con las políticas de transparencia y rendición de cuentas impulsadas por la gestión gubernamental.

### ***II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión, período Julio-septiembre del año 2020.***

Contribuir con el logro de los objetivos institucionales, el Plan Plurianual Institucional de Inversión Pública y los resultados esperados dentro de lo establecido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y así cumplir con lo establecido en el marco legal sobre presupuesto, planificación e inversión, en lo relativo a la ejecución física y financiera de los proyectos desarrollados con fondos públicos y externos en el seguimiento de la ejecución de la inversión, a la luz del sistema de rendición de cuentas.

El alcance de este informe sólo abarca los proyectos contemplados en el presupuesto anual y ejecutado por la institución en el trimestre julio-septiembre del 2020.

### ***III. Marco metodológico de la elaboración del informe.***

Para la elaboración de éste informe la metodología utilizada fue mediante recopilación, revisión y validación de las informaciones suministradas por las unidades ejecutoras de proyectos, el cual consta de la ejecución física (metas alcanzadas) y de la ejecución financiera, es decir, la inversión total ejecutada con respecto al presupuesto aprobado en el año, por programas presupuestario, fuentes de financiamiento de los proyectos, organismos financiadores, componente de inversión, actividades y objeto del gasto según estructura presupuestaria del SIGEF. El instrumento utilizado es una serie de matrices emitidas por el órgano rector y las elaboradas en la DPI.

### ***IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, período julio-septiembre año 2020.***

Para período Julio-septiembre del año 2020, la inversión pública del Ministerio de Salud Pública estuvo sustentada en la ejecución en tres proyectos:

- 1) Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana,
- 2) Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, los cuales tienen como unidad ejecutora la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS) y
- 3) Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana, los cuales contribuyen a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, la reducción de la incidencia de las infecciones de VIH en las poblaciones de mayor riesgo y mejora de la




capacidad de los SRS para proveer servicios de calidad. Este proyecto tiene como unidad ejecutora el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

Los mismos están contenidos dentro de la estructura programática presupuestaria en los programas actividades centrales y salud colectiva.


#### IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública.

##### IV.1.1 Presupuesto aprobado Vs. ejecutado.

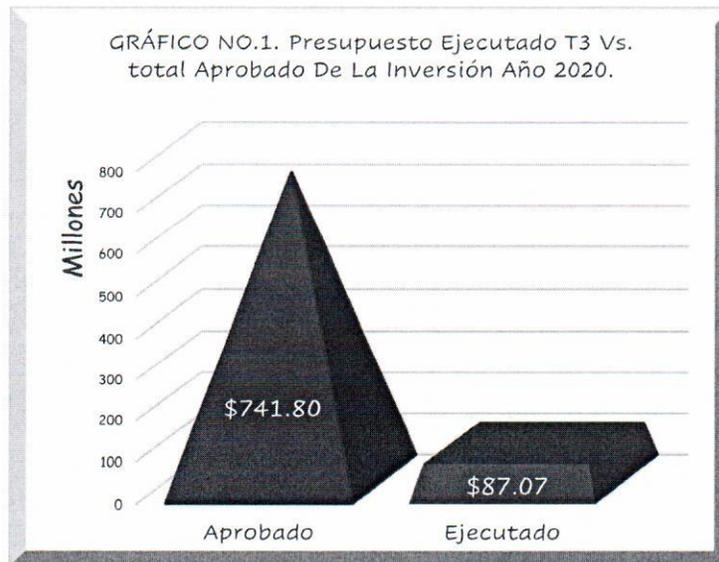


El presupuesto aprobado para ejecutar los proyectos de inversión pública en el año 2020 en el Ministerio, ascendió a **RD\$741,767,503.00**, de los cuales **RD\$476,985,438.00** corresponden a fuentes de financiamiento del Fondo General (Tesoro Nacional), **RD\$150,000,000.00** son de crédito externo y **RD\$114,782,065.00** provienen de donaciones externas, de los cuales se ejecutó en el Trimestre **julio-septiembre 2020** un monto total de **RD\$87,068,417.54**.

Para este período el presupuesto ejecutado con respecto al aprobado en el año fue de un **78.98%** en el programa de **Actividades Centrales**, el cual contempla los proyectos **Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana** y **Fortalecimiento de Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana**, financiados con créditos externos y de un **21.02%** para el programa **Servicios De Salud Colectiva** mediante el proyecto de **Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana**.

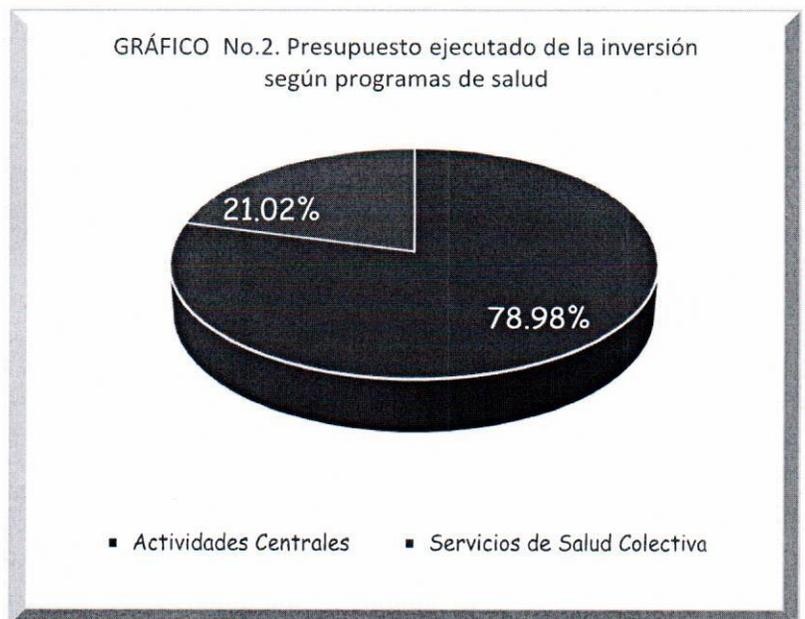


#### IV.1.2 Ejecución de la inversión por fuente de financiamiento, trimestre julio-septiembre año 2020.

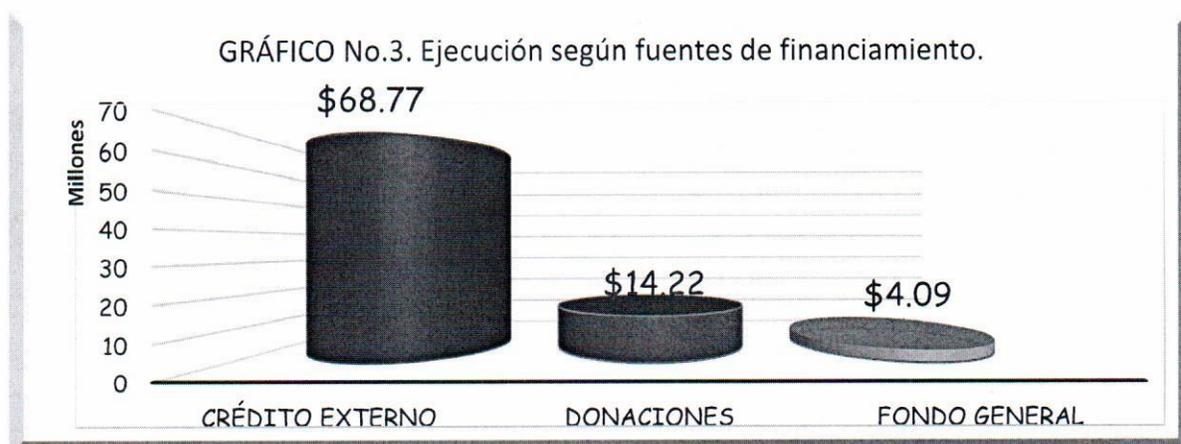

La inversión por fuente de financiamiento fue realizada, según muestra el gráfico anterior, de la forma siguiente: fueron ejecutados **RD\$68,765,021.91 del total, financiados con Créditos Externos** el cual contempla los proyectos **Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom.** y **Fortalecimiento de Gestión por Resultados del Sector Salud en Rep. Dominicana**, **RD\$14, 216,141.73, a través de Donaciones Externas** y **RD4, 087,253.90, del Fondo General del gobierno central** para el proyecto de Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana.

#### IV.1.3 Organismos financiadores de la inversión.

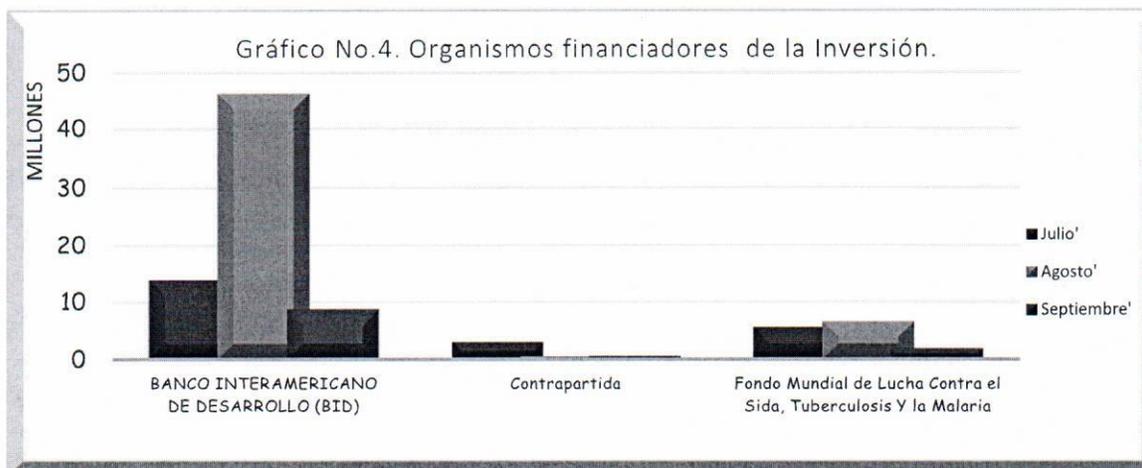

Los organismos financiadores que contribuyeron con el desarrollo de la inversión del Ministerio de Salud Pública en función del trimestre, fueron: El **Fondo General** que mediante su aporte se ejecutó un monto de **RD\$14, 216,141.73 del total general**, el **Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM)** mediante su apoyo se ejecutó un total de **RD \$4,087,253.90 del total general** y del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)** se ejecutó un valor de **RD\$68,765,021.91 del total general** de la inversión en el período Julio-Septiembre año 2020.



#### IV.1.4 Ejecución financiera por componentes de inversión de los proyectos.

##### IV.1.4.1 Componentes del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.

Como muestra el cuadro siguiente No.1, el proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período Julio-Septiembre año 2020, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, los cuales son: asistencia técnica, campaña publicitaria y fortalecimiento institucional, cuyos recursos provienen de los organismos financiadores contrapartida del Gobierno Central y donación externa del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM).

En lo que respecta a la fuente de financiamiento de contrapartida, esta aplica en tres renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a **RD\$18, 303,395.63**, estos se distribuyen de la siguiente forma: **asistencia técnica con el 4.52%, campaña publicitaria 0.71% y fortalecimiento institucional a 10.9%**, correspondientes al total ejecutado en esta fuente de financiamiento, lo que representa una ejecución del **6.91%** del presupuesto aprobado de dicho Trimestre.

En su conjunto los componentes de inversión participan tal como se presentan el cuadro siguiente:

**Cuadro No. 1. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período Julio-septiembre año 2020.**

Componentes	Presupuesto aprobado vs Ejecutado		
	Aprobado	Ejecutado	%
Asistencia técnica	135,720,216.00	6,136,635.21	4.52%
Campaña publicitaria	18,351,699.00	129,895.52	0.71%
Fortalecimiento institucional	110,710,150.00	12,036,864.90	10.9%
<b>Total, general =====&gt;</b>	<b>264,782,065.00</b>	<b>18,303,395.63</b>	<b>6.91%</b>

Fuente: Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020

##### IV.1.4.2 Componentes del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.

Como muestra el cuadro No. 2 siguiente, el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, en el período Julio-septiembre año 2020, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, estos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

**Cuadro No. 2. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, período Julio-septiembre año 2020**

Componentes	Presupuesto aprobado vs ejecutado		
	Aprobado	Ejecutado	%
Capacitación	59,541,175.00	22,302,971.33	37.46
Diseño del Proyecto	59,541,175.00	27,445,063.29	46.09
Fortalecimiento institucional	59,541,175.00	3,960,676.43	6.65
<b>Total, general =====&gt;</b>	<b>178,623,525.00</b>	<b>53,708,711.05</b>	<b>30.06</b>

En lo que respecta a la fuente de financiamiento de préstamo externo, esta contribuye en los renglones de los componentes de inversión, con un total ejecutado ascendente a **RD\$53,708,711.05** estos se distribuyen de la siguiente forma: **capacitación 37.46%, diseño del proyecto con el 46.09%** y fortalecimiento **institucional 6.65%**, correspondientes al total ejecutado en esta fuente de



*[Handwritten signature]*

financiamiento, lo que representa una ejecución del **30.06%** del presupuesto aprobado de dicho Trimestre.

**IV.1.4.3 Componentes del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.**

Como muestra el cuadro siguiente No. 3, el proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, en el período Julio-septiembre año 2020, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, dichos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presupuesto aprobado asciende a RD\$298,361,913.00 y registra una ejecución ascendente a RD\$15,056,310.86 lo que representa una ejecución del 5.05% del presupuesto aprobado de este Trimestre. La ejecución se distribuye de la siguiente forma: capacitación con el 8.25%, asistencia técnica con el 1.97%, diseño del proyecto con el 3.49%, y el 6.48 fortalecimiento institucional. En su conjunto los componentes de inversión participan tal como se presentan el cuadro siguiente:

**Cuadro No. 3. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom., período Julio-septiembre año 2020**

Componentes	Presupuesto aprobado vs ejecutado		
	Aprobado	Ejecutado	%
Capacitación	74,590,478.00	6,153,438.88	8.25
Asistencia técnica	74,590,478.00	1,466,215.00	1.97
Diseño del Proyecto	74,590,478.00	2,605,461.10	3.49
Fortalecimiento institucional	74,590,479.00	4,831,195.88	6.48
<b>Total, general =====&gt;</b>	<b>298,361,913.00</b>	<b>15,056,310.86</b>	<b>5.05</b>


**IV.1.5 Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto**

**Cuadro No.4. Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.**

Descripción del gasto	Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana	Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom.	Total
2.1-Remuneraciones y contribuciones	5,653,862.08	0.00	0.00	5,653,862.08
2.2-Contratación de servicios	12,261,984.29	53,708,711.05	15,056,310.86	81,027,006.20
2.3-Materiales y suministros	250,199.39	0.00	0.00	250,199.39
2.5-Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	137,349.87	0.00	0.00	137,349.87
<b>Total, general</b>	<b>18,303,395.63</b>	<b>53,708,711.05</b>	<b>15,056,310.86</b>	<b>87,068,417.54</b>

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período julio-septiembre año 2020.

Como muestra el cuadro anterior, los proyectos de inversión pública, en período Julio-septiembre año 2020, la ejecución financiera según el clasificador presupuestario del gobierno registra la mayor inversión en la contratación de servicios, la cual representa el 93.06% del total de la inversión, en la que se destacan los servicios técnicos profesionales, mediante la contratación de asistencia técnica, consultorías y los pagos de servicios relacionados con la gestión del proyecto.



#### IV. 2 Ejecución física de la inversión pública por proyecto.

##### IV.2.1. Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.

Con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.7 de la END, la cual establece “Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados”, el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la Región Metropolitana de la Rep. Dom. alcanzó en el trimestre Julio-Septiembre el avance siguiente:

**Cuadro No. 5. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, Julio-septiembre año 2020.**

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta programada	Meta lograda	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD\$
Aumentar la capacidad de resolutive del Sector Salud en la Región Metropolitana de R.D.	Capital humano	Capacitación	Personas capacitadas	200	50	25%	6,153,438.88
		Asistencia técnica	Número de asistencia técnica implementadas al personal				1,466,215.00
		Diseño del proyecto	N/A				2,605,461.10
		Fortalecimiento Institucional	N/A				4,831,195.88
<b>Total, ejecutado</b>				<b>200</b>	<b>50</b>	<b>25 %</b>	<b>15,056,310.86</b>

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, julio-septiembre año 2020.

##### IV.2.2 Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.

Con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.7 de la END, la cual establece “Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP) y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados”, el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana alcanzó de julio-septiembre del año 2020, los siguientes indicadores físicos:

**Cuadro No.6. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, Julio-Septiembre año 2020.**

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta programada	Meta lograda	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD\$
Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejoras gerenciales en los servicios de salud de segundo y tercer nivel.	Capital humano	Capacitación	Personas capacitadas.	250	63	25.2%	22,302,971.33
		Diseño del proyecto	N/A				27,445,063.29
		Fortalecimiento institucional	N/A				3,960,676.43
<b>Total</b>				<b>250</b>	<b>63</b>	<b>25.2%</b>	<b>53,708,711.05</b>

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, Julio-septiembre año 2020.



### IV.2.3 Prevención y Atención a las poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.

El proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, con actividad principal control y atención del VIH/SIDA en República Dominicana alcanzó en período Julio-Septiembre del año 2020, los indicadores físicos más abajo citados con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.2 de la END, la cual establece “Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix, y próstata, entre otras), así como el fomento del estilo de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en la pobreza extrema”.

**Cuadro No.7. Datos de avance en meta del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, Julio-Septiembre del año 2020.**

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta programada Julio /Sept.	Meta lograda Julio/Sept.	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD\$
Reducir la incidencia de las infecciones de VIH en las poblaciones de mayor riesgo en la República Dominicana, con énfasis en las provincias priorizadas.	Capital humano	Asistencia técnica, Campaña publicitaria, Fortalecimiento institucional	KP-3a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	29,135	14,555	50%	18,303,395.63
			KP-3b: Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	905	486	53%	
			KP-3c: Porcentaje de trabajadores del sexo que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	19,370	8,882	45.9%	
			KP-3e: Porcentaje de migrantes haitianos de 15 a 49 años en 9 provincias que se han sometido a una prueba del VIH y conocen los resultados	19,293	6,796	35.2%	
			KP-3e: Porcentaje de mujeres de bateyes en vulnerabilidad social (MVS) que se han sometido a una prueba del VIH y conocen los resultados	9,705	3,700	38.1%	
			TCS-1: Porcentaje de adultos y niños que actualmente reciben tratamiento antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH	58,308	34,271	58.8%	
			TB/HIV-4: Porcentaje de nuevos pacientes seropositivos que han comenzado tratamiento preventivo con isoniazida (TPI) durante el período de informe	612	205	33.5%	
<b>Total, Ejecutado</b>						<b>18,303,395.63</b>	

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, julio-septiembre año 2020.



V. Anexo

Anexo 1. Matriz de ejecución física - financiera de la inversión julio-septiembre año 2020.																								
Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera										
		Inicio	Termino		Provincias	Proporción (%)				Ejecución Física				Distribución de la ejecución Julio -septiembre										
							Unidad de medida	Meta programa da 2020	Avance físico julio/septiembre	% Avance físico	Pres. Aprobado 2020	Fondos generales			Crédito externo			Donaciones						
												Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto				
13503	Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana	2013	2021	En ejecución	Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Barahona, Independencia, Pedernales, La Altagracia, El Seibó, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Mao-Valverde, Sánchez Ramírez	100%	N/D	Capacitación	Capacitación fortalecimiento de la gestión por resultados del sector salud en la Rep. Dom.	Personas	200	50	25%	59,541,175.00	N/A	N/A	0	30	600	N/A	N/A	22,302,971.33	0	
								Diseño del Proyecto.	Diseño del proyecto para el fortalecimiento de la gestión por resultados del sector salud en la Rep. Dom.					59,541,175.00								0	27,445,063.29	0
								Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento institucional y gestión por resultados del sector salud en la República Dominicana					59,541,175.00								0	3,960,676.43	0
											200	0	0.00%	178,623,525.00			0					53,708,711.05	0	



Informe de ejecución de las inversiones, tercer trimestre 2020 (julio-septiembre)

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera									
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)				Ejecución Física				Pres, Aprobado 2020	Distribución de la ejecución Julio -septiembre								
							Unidad de medida	Meta programada 2020	Avance físico enero-marzo	% Avance físico	Fondos generales				Crédito externo			Donaciones					
											Fuente específica	Organismo financiador	Monto		Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto			
13853	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	2016	2021	En ejecución	Santo Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata	100%	N/D	Capacitación	Capacitar a técnicos del nivel central para implementar el nuevo modelo de financiamiento y regulación	Personas	250	63	25.2%	74,590,478.00	N/A	N/A	6037	301	0	6,153,438.88	N/A	N/A	0
								Asistencia técnica	Dar asistencia al personal de salud de la región metropolitana en la implementación del financiamiento basado en resultado					74,590,478.00					0	1,466,215.00			0
								Diseño del proyecto	Diseño del proyecto para el fortalecimiento del proyecto de inversión					74,590,478.00					0	2,605,461.10			0
								Fortalecimiento institucional	Fortalecer la capacidad rectora del MSP e implementar el modelo de financiamiento basado en resultado en la región 0					74,590,479.00					0	4,831,195.88			0
										250	0	0.00%	298,361,913.00				0					15,056,310.86	0



*[Handwritten signature]*

Informe de ejecución de las inversiones, tercer trimestre 2020 (julio-septiembre)

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera								
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)				Ejecución Física			Presupuestado 2020 (Vigente)	Distribución de la ejecución Julio -septiembre								
							Unidad de medida	Meta anual programada 2020	Avance físico julio-septiembre	% Avance físico	Fondos generales			Crédito externo			Donaciones					
											Fuente específica	Organismo financiador		Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto		
13854	Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana	2019	2021	En ejecución	Barahona, Da jabón, Independencia, La Altagracia, La Romana, Montecristi, Pedernales, Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Puerto Plata	100%	N/D	Asistencia técnica	Personas alcanzadas	347,504	332,875	000%	135,720,216.00	101	4,087,253.90	N/A	N/A	Donación externa	348	14,216,141.73		
								Campaña publicitaria					18,351,699.00									
								Fortalecimiento institucional					110,710,150.00									
									347,504	332,875	000%	264,782,065.00		4,087,253.						4,087,253		
											Presupuesto vigente	741,767,503.00	Total, ejecutado								18,303,395.63	
																			Total, general de la ejecución		87,068,417.54	



*[Handwritten signature]*
